



Sustav odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda
AGLOMERACIJE VELIKA GORICA

STANJE RADOVA DO 30.06.2020. GODINE

Mjesečno stanje radova projekta
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica


RAZDOBLJE IZVJEŠĆA: 01.06.2020 – 30.06.2020

Korisnik projekta: VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Zagreb, lipanj 2020.

A1. REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NA ŠIREM I UŽEM PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE

Vizualni prikaz stanja radova na lotu A1

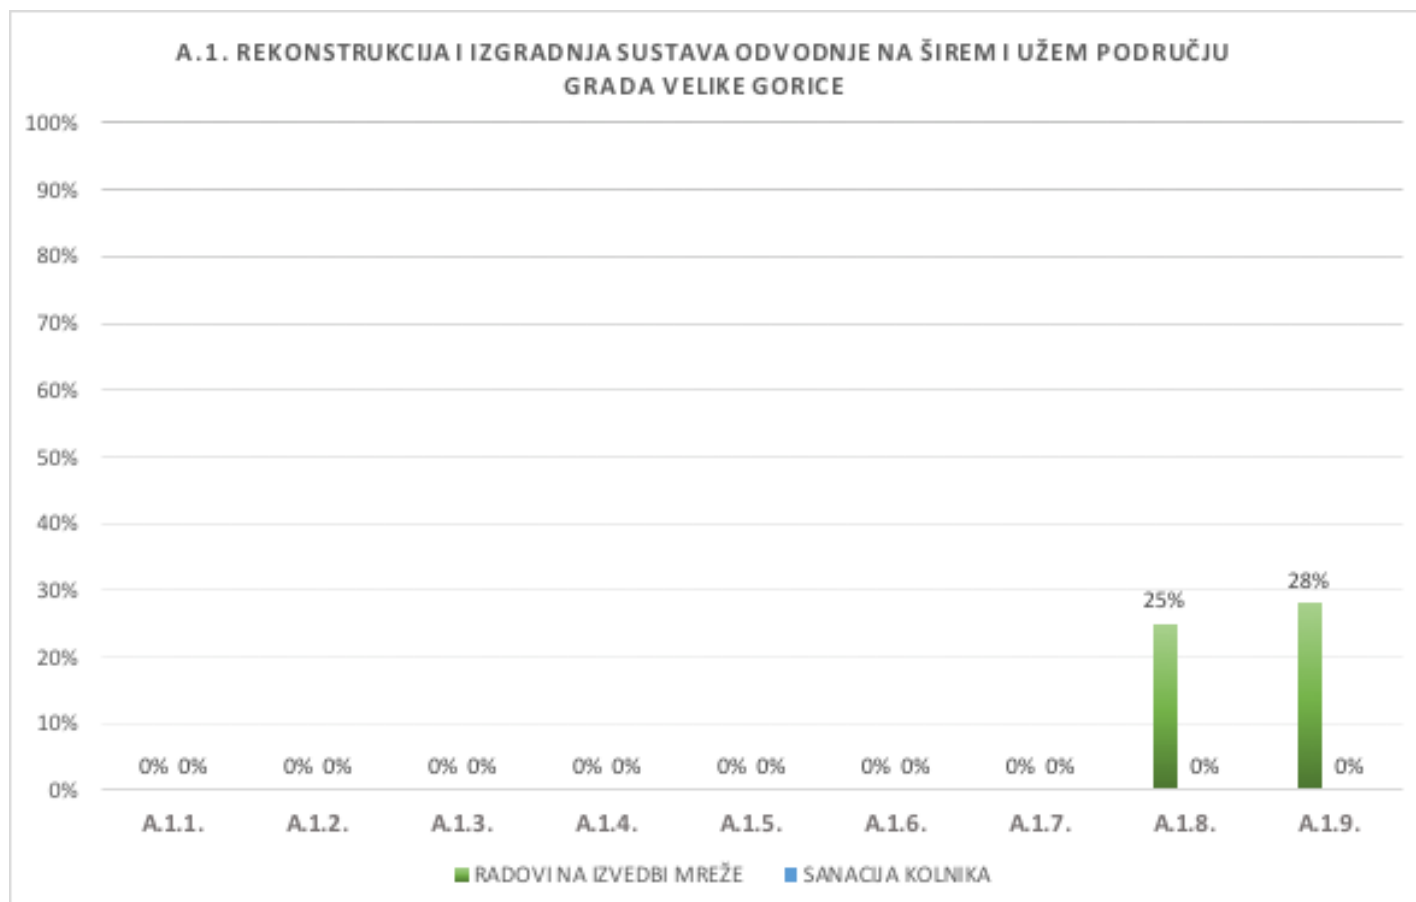

Legenda – popis dionica

A.1.1.	Kolektor fekalne kanalizacije 4 u Vukomeričkoj i Teslinoj ulici (Kolektor 4 u Vukomerička i Teslina ulica)
A.1.2.	Kolektor fekalne kanalizacije 1 u ulicama P. Svačića, S. Držislava, Zvonimirovoj i Ratimirovoj i kolektor fekalne kanalizacije 2 na Krešimirovom trgu (Zamjenski KOLEKTORI K-1 i K-2)
A.1.3.	Kolektor fekalne kanalizacije - dio kolektora Velika Mlaka – Velika Gorica uz ist.obilaznicu do UPOVa (Dio FK spojni V.MLAKA - V.GORICA)
A.1.4.	Crpna stanica fekalne odvodnje u ulici A.K. Miošića i tlačni kolektor (PS i tlačni kolektor ulica A.K.Miošića)
A.1.5.	Fekalni kanali i crpna stanica u naselju Velika Mlaka (FK NASELJE VELIKA MLAKA sa PS)
A.1.6.	Fekalni kolektor Tuklače i crpne stanice Tuklače (FK TUKLAČE i PS Tuklače)
A.1.7.	Zamjenski kolektor fekalne kanalizacije 1a (Zamjenski kolektor K-1A)
A.1.8.	Zamjenski kolektor fekalne kanalizacije Podbrežnica - Rakarje u ulicama Rudolfa Fizira, Kardinala Alojzija Stepinca i Hrvatske bratske (FK spojni PODBREŽNICA – RAKARJE)
A.1.9.	Odvodnja otpadnih voda u naselju Lukavec (FK NASELJA LUKAVEC)

Ukupna izgrađenost po dionicama od 01.06.2020. do 30.06.2020. godine:

- **A.1.8. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE PODBREŽNICA-RAKARJE**
 - ukupno je izgrađeno 427,54 m
- **A.1.9. FEKALNI KANALI U NASELJU LUKAVEC**
 - ukupno je izgrađeno 2.460,20 m



Iskop rova uz korištenje razupore te oplata protu uzgonskog prstena revizijskog okna na cjelini A.1.9. Lukavec




Zatrpavanje rova u slojevima na cjelini A.1.9. Lukavec

U narednom periodu planiraju se radovi na dionicama:

- **A.1.8. FEKALNA KANALIZACIJA PODBREŽNICA – RAKARJE**
 - Na kolektoru fekalne kanalizacije Podbrežnica – Rakarje izvode se radovi u naselju Velika Gorica na dionici od Ulice Rudolfa Fizira kroz područje koje je obuhvaćeno Gradskim vrtovima te uz pješačku stazu i sjevernu ogradu Gradskog groblja prema križanju ulice Jurja Dobrile i Alojzija Stepinca.
- **A.1.9. FEKALNI KANALI U NASELJU LUKAVEC**
 - Na fekalnim kanalima u naselju Lukavec izvodit će se kućni priključci u Ulici Solarke, a radovi se nastavljaju u Tratinskoj ulici, Starogradskoj ulici, Novoj cesti i Rasadničkoj ulici te se započinje s radovima u Dolenskoj ulici.

A2. DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE OKO BUDUĆEG CRPILIŠTA ČRNKOVEC

Vizualni prikaz stanja radova na lotu A2

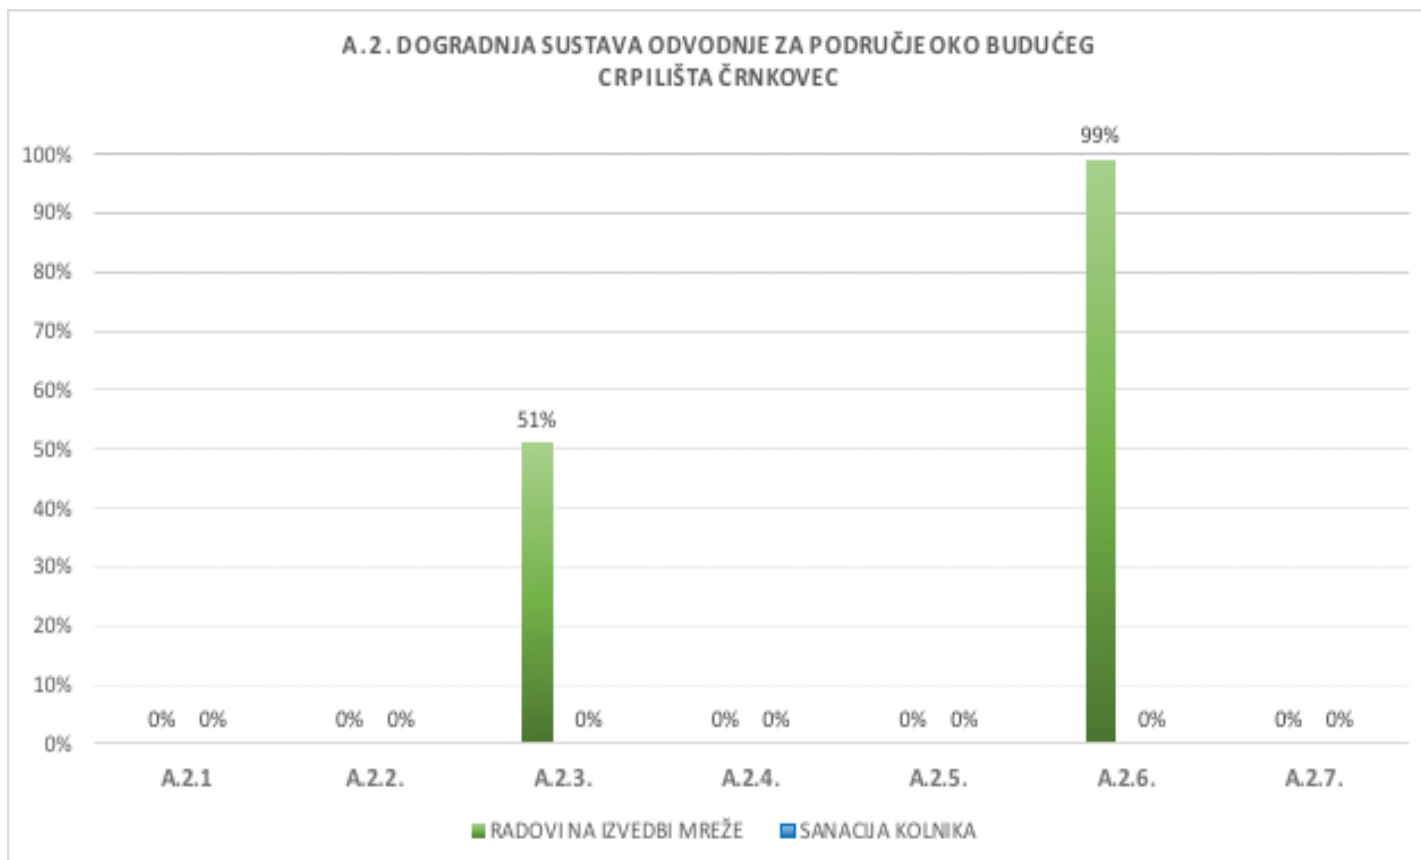

Legenda – popis dionica

A.2.1	Fekalna odvodnja naselja: Selnica, Mala kosnica, Velika kosnica i Petina (FK NASELJA SELNICA, M.KOSNICA, V.KOSNICA i PETINA)
A.2.2.	Fekalna odvodnja naselja: Črnkovec, Lekneno i Trnje (FK NASELJA ČRNKOVEC - LEKNENO – TRNJE)
A.2.3.	Fekalna odvodnja naselja Kobilić (FK NASELJE KOBILIĆ)
A.2.4.	Fekalna odvodnja naselja: Ščitarjevo, Obrezina, Novaki ščitarjevski i Sasi (FK NASELJA ŠČITARJEVO, OBREZINA, NOVAKI i SASI)
A.2.5.	Fekalna odvodnja naselja: Drenje ščitarjevsko i dio Ščitarjeva (FK NASELJA DRENJE Š i ŠČITARJEVO)
A.2.6.	Kolektor fekalne kanalizacije Kobilić – Rakarje – kolektor 1 i crpna stanica 7 – 2. faza (FK spojni KOBILIĆ - RAKARJE, kolektor K-1 sa PS7)
A.2.7.	Fekalna odvodnja naselja Bapča s kolektorom i crpne stanice Bapča i Črnkovec 2 (FK NASELJE BAPČA sa PS Bapča i Črnkovec2)

Ukupna izgrađenost po dionicama od 01.06.2020. do 30.06.2020. godine:

- **A.2.3. FEKALNA ODVODNJA NASELJA KOBILIĆ**
 - Ukupno je izgrađeno 1.028,47 m
- **A.2.6. GRAVITACIJSKI KOLEKTORI: K-2 i K-2.1, tlačni cjevovod i crpna stanica Kobilić 2**
 - Ukupno je izgrađeno 1.815,20 m



Gravitacijski kanal



Zabijanje talpi na mjestu ugradnje crpne stanice



Tlačni kanal



Doprema okna crpne stanice CS Kobilić 2 na gradilište




Strojno rezanje, razbijanje i raskopavanje postojećeg asfaltnog zastora kolnika

U narednom periodu planiraju se radovi na dionicama:

- **A.2.3. FEKALNA ODVODNJA NASELJA KOBILIĆ**
 - Na fekalnoj odvodnji naselja Kobilić završava se s kanalima te se započelo s izvedbom kućnih priključaka.
- **A.2.6. GRAVITACIJSKI KOLEKTORI: K-2 i K-2.1, TLAČNI CJEVOVOD I CRPNA STANICA KOBILIĆ 2**
 - Na navedenoj dionici izvedeni su gravitacijski kolektori: K-2 i K-2.1 i tlačni cjevovod, a završava se gradnja crpne stanice Kobilić, te će se ugraditi elektrostrojarska oprema.

A3. DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA

Vizualni prikaz stanja radova na lotu A3

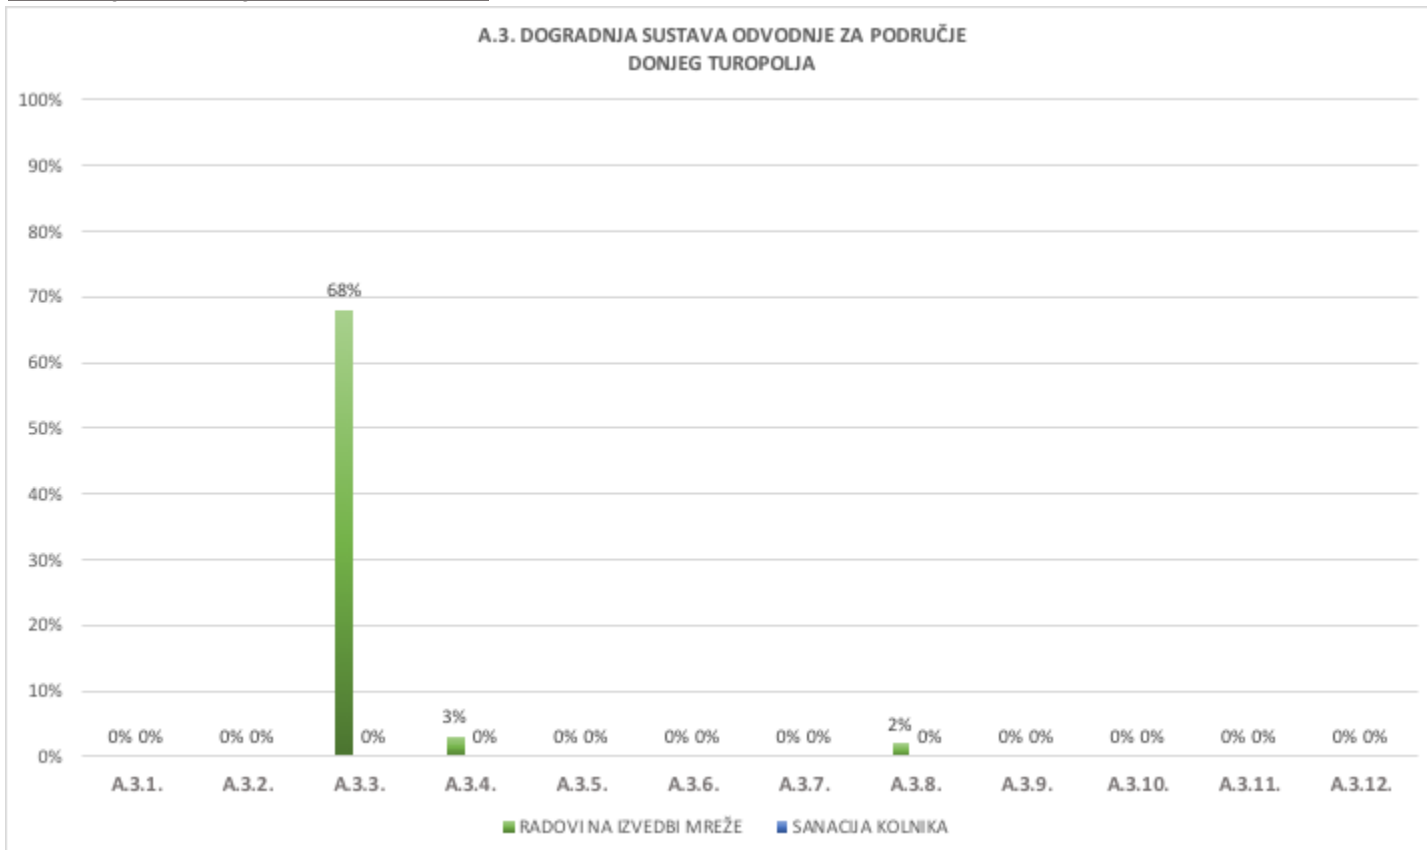

Legenda – popis dionica

A.3.1.	Sustav odvodnje Donjeg Turopolja, podsustav (tehnoekonomska cjelina) Buševac - Ogulinec - 1. faza gradnje (TEC BUŠEVEC-OGULINEC 1.FAZA)
A.3.2.	Sustav odvodnje Donjeg Turopolja, podsustav (tehnoekonomska cjelina) Buševac - Ogulinec - 2. faza gradnje (TEC BUŠEVEC-OGULINEC 2.FAZA)
A.3.3.	Sustav odvodnje Donjeg Turopolja, podsustav (tehnoekonomska cjelina) Mraclin - Okuje – 1. faza gradnje (TEC MRACLIN-OKUJE 1.FAZA)
A.3.4.	Sustav odvodnje Donjeg Turopolja, podsustav (tehnoekonomska cjelina) Mraclin - Okuje – 2. faza gradnje (TEC MRACLIN-OKUJE 2.FAZA)
A.3.5.	Sustav odvodnje Donjeg Turopolja, podsustava Gornje Podotočje – Kuće – 2.faza gradnje (TEC KUĆE-G.PODOTOČJE 2.FAZA)
A.3.6.	Sustav odvodnje Donjeg Turopolja, podsustav (tehnoekonomska cjelina) Turopolje – Rakitovec – 1. faza gradnje (TEC TUROPOLJE-RAKITOVEC 1.FAZA-spojni)
A.3.7.	Sustav odvodnje Donjeg Turopolja, podsustav (tehnoekonomska cjelina) Turopolje - Rakitovec – 2. faza gradnje (TEC TUROPOLJE-RAKITOVEC 2.FAZA)
A.3.8.	Sustav odvodnje Donjeg Turopolja, podsustava Vukovina - Staro Čiče (TEC STARO ČIČE – VUKOVINA)
A.3.9.	Sustav odvodnje Donjeg Turopolja, Spojni kanal CS Velika Kišovina - UPOV Velika Gorica (VELIKA KIŠOVINA- UPOV)
A.3.10.	Sanacija Mraclin-Okuje
A.3.11.	Sanacija Busevec-Ogulinec
A.3.12.	Sanacija Kuće-G. Podotocje

Ukupna izgrađenost po dionicama od 01.06.2020. do 30.06.2020. godine:

- **A.3.3. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 1. faza gradnje**
 - ukupno je izgrađeno 1.542,71 m
- **A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. faza gradnje**
 - ukupno je izgrađeno 276,78 m
- **A.3.8. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) VUKOVINA – STARO ČIĆE**
 - ukupno je izgrađeno 230,11 m
 -



Polaganje cijevi i zatrpavanje rova na gravitacijskom kanalu



Polaganje cijevi i zatrpavanje rova na gravitacijskom kanalu



Zatrpavanje uz nabijanje lakim strojnim nabijačima

U narednom periodu planiraju se radovi na dionicama:

- **A.3.3. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAV (TEC) MRACLIN-OKUJE, 1. FAZA GRADNJE**
 - Na sustavu odvodnje Donjeg Turopolja Podsustav (TEC) Mraclin-Okuje 1. faza gradnje izvode se radovi u naselju Mraclin u Ulici braće Radića (kod trafostanice).
- **A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAV (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. FAZA GRADNJE**
 - Na sustavu odvodnje Donjeg Turopolja Podsustav (TEC) Mraclin-Okuje 2. faza gradnje izvode se radovi u naselju Mraclin u II. Odvojk Ulice braće Radića (kod željezničke stanice). U naselju Okuje izvodit će se radovi u glavnoj ulici koja prolazi kroz naselje.
- **A.3.8. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAV (TEC) VUKOVINA-STARO ČIČE**
 - Na sustavu odvodnje Donjeg Turopolja Podsustav (TEC) Vukovina- Staro Čiče nastavljaju se radovi u naselju Staro Čiče u Ulici Jurja Habelića.
