



Sustav odvodnje i  
pročišćavanja otpadnih voda  
AGLOMERACIJE VELIKA GORICA

## STANJE RADOVA DO 31.07.2020. GODINE

Mjesečno stanje radova projekta  
**Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica**


**RAZDOBLJE IZVJEŠĆA: 01.07.2020 – 31.07.2020**

Korisnik projekta: VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Zagreb, srpanj 2020.

## A1. REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE NA ŠIREM I UŽEM PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE

### Vizualni prikaz stanja radova na lotu A1

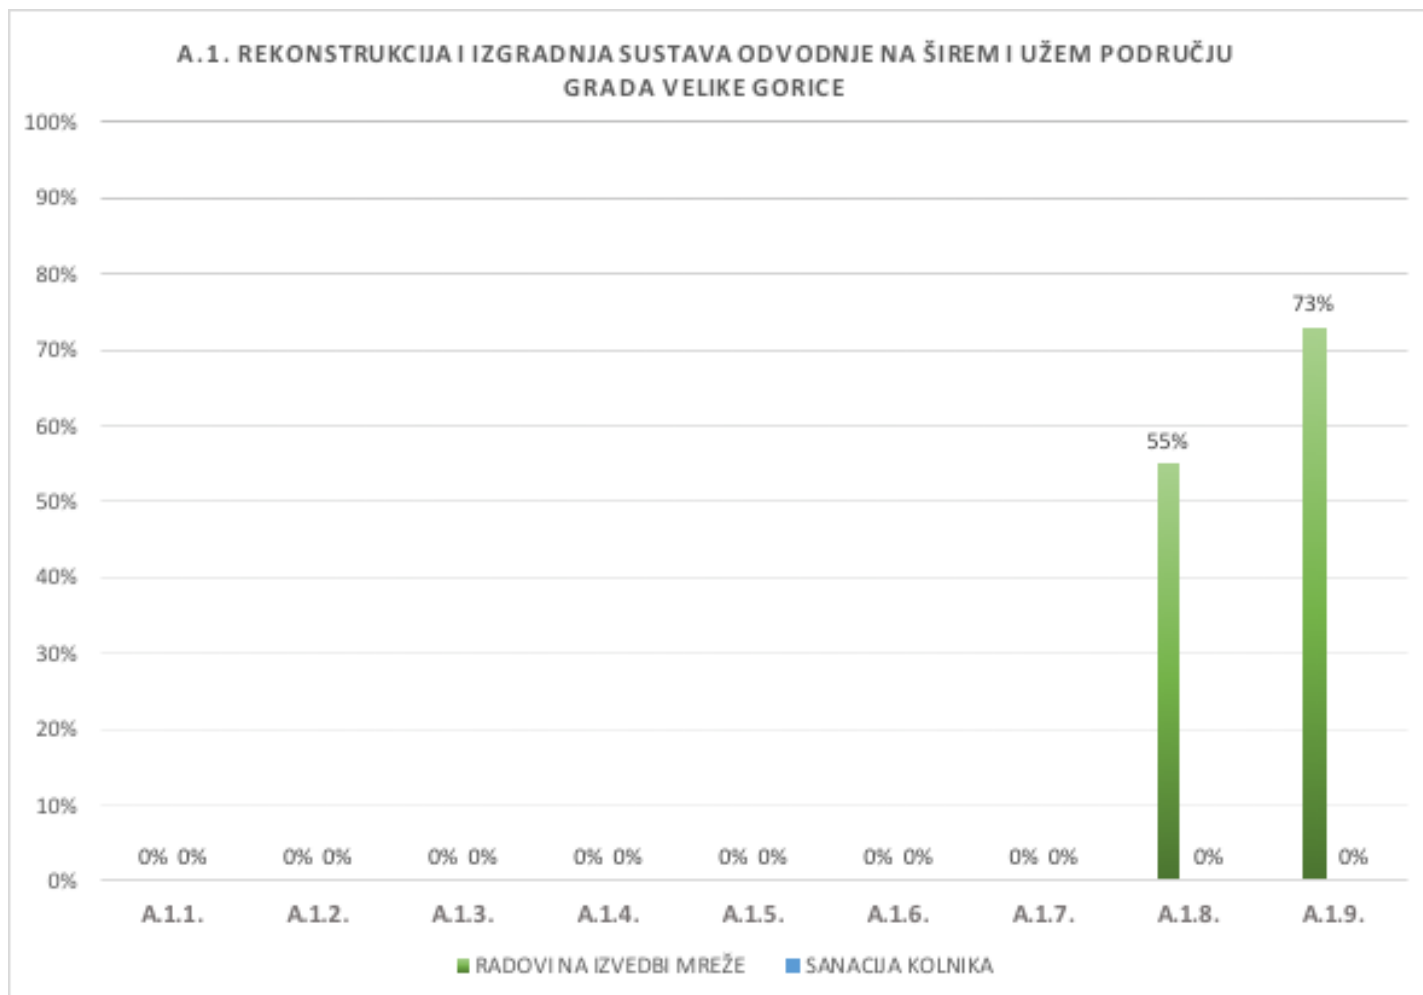

### Legenda – popis dionica

|               |                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.1.1.</b> | Kolektor fekalne kanalizacije 4 u Vukomeričkoj i Teslinoj ulici (Kolektor 4 u Vukomerička i Teslina ulica)                                                                            |
| <b>A.1.2.</b> | Kolektor fekalne kanalizacije 1 u ulicama P. Svačića, S. Držislava, Zvonimirovoj i Ratimirovoj i kolektor fekalne kanalizacije 2 na Krešimirovom trgu (Zamjenski KOLEKTORI K-1 i K-2) |
| <b>A.1.3.</b> | Kolektor fekalne kanalizacije - dio kolektora Velika Mlaka – Velika Gorica uz ist.obilaznicu do UPOVa (Dio FK spojni V.MLAKA - V.GORICA)                                              |
| <b>A.1.4.</b> | Crpna stanica fekalne odvodnje u ulici A.K. Miošića i tlačni kolektor (PS i tlačni kolektor ulica A.K.Miošića)                                                                        |
| <b>A.1.5.</b> | Fekalni kanali i crpna stanica u naselju Velika Mlaka (FK NASELJE VELIKA MLAKA sa PS)                                                                                                 |
| <b>A.1.6.</b> | Fekalni kolektor Tuklače i crpne stanice Tuklače (FK TUKLAČE i PS Tuklače)                                                                                                            |
| <b>A.1.7.</b> | Zamjenski kolektor fekalne kanalizacije 1a (Zamjenski kolektor K-1A)                                                                                                                  |
| <b>A.1.8.</b> | Zamjenski kolektor fekalne kanalizacije Podbrežnica - Rakarje u ulicama Rudolfa Fizira, Kardinala Alojzija Stepinca i Hrvatske bratske (FK spojni PODBREŽNICA – RAKARJE)              |
| <b>A.1.9.</b> | Odvodnja otpadnih voda u naselju Lukavec (FK NASELJA LUKAVEC)                                                                                                                         |

**Ukupna izgrađenost po dionicama od 01.07.2020. do 31.07.2020. godine:**

- **A.1.8. KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE PODBREŽNICA-RAKARJE**
  - ukupno je izgrađeno 989,75 m
- **A.1.9. FEKALNI KANALI U NASELJU LUKAVEC**
  - ukupno je izgrađeno 5.175,30 m



*Postava gornje AB ploče okna*



*Zatrpavanje cijevi  
pijeskom*




*Zatrpavanje rova zamjenskim  
materijalom*

**U narednom periodu planiraju se radovi na dionicama:**

- **A.1.8. FEKALNA KANALIZACIJA PODBREŽNICA – RAKARJE**
  - Na kolektoru fekalne kanalizacije Podbrežnica – Rakarje izvode se radovi u naselju Velika Gorica na dionici od Ulice Rudolfa Fizira uz sjevernu ogradu Gradskog groblja prema križanju Ulice Jurja Dobrile i Alojza Stepinca.
- **A.1.9. FEKALNI KANALI U NASELJU LUKAVEC**
  - Na fekalnim kanalima u naselju Lukavec završavati će se radovi u Ulici Ciglenice, Starogradskoj ulici i u odvojk Tratinske ulici, a radovi se nastavljaju u Novoj cesti i Rasadničkoj ulici.

## A2. DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE OKO BUDUĆEG CRPILIŠTA ČRNKOVEC

### Vizualni prikaz stanja radova na lotu A2

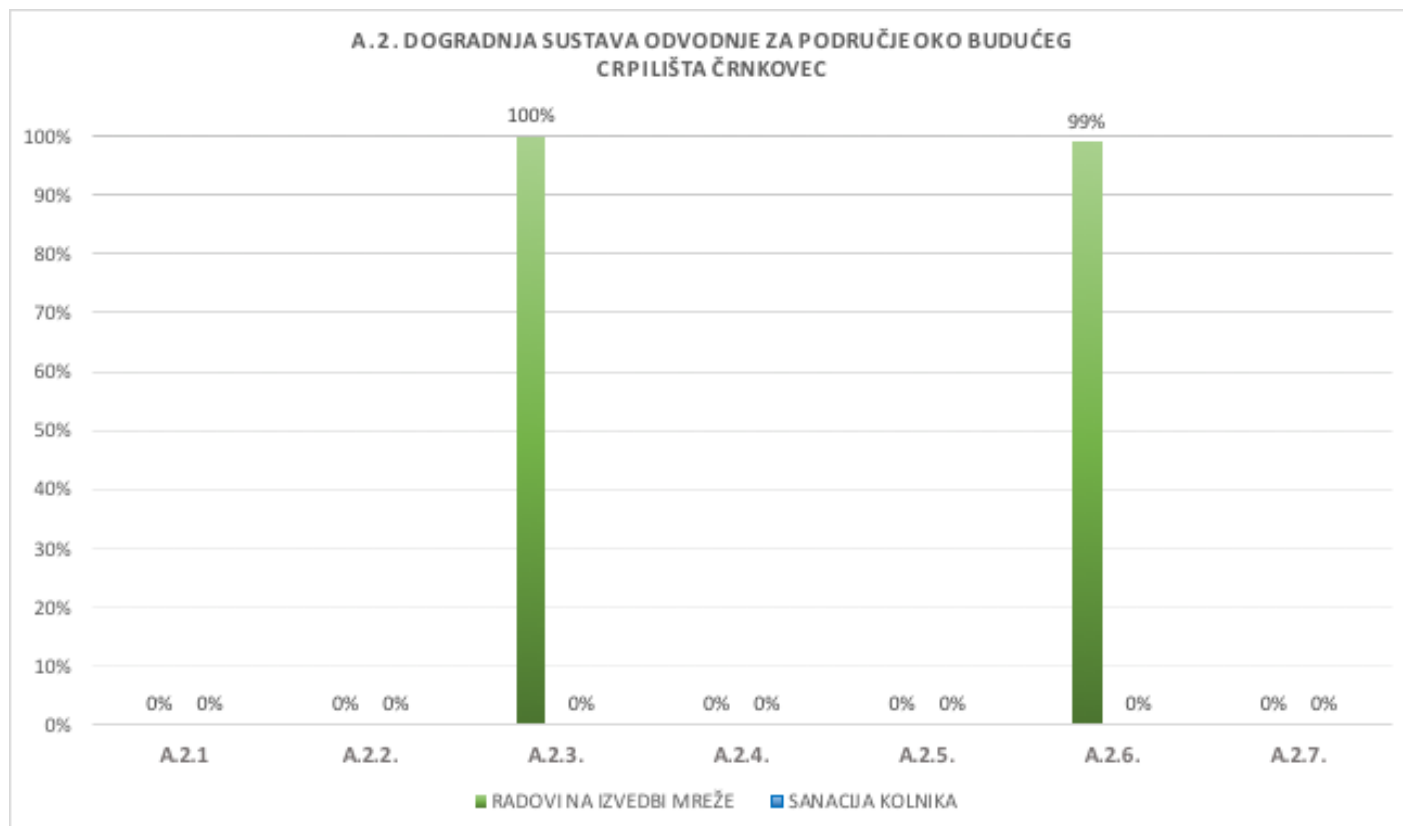

### Legenda – popis dionica

|               |                                                                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.2.1</b>  | Fekalna odvodnja naselja: Selnica, Mala kosnica, Velika kosnica i Petina (FK NASELJA SELNICA, M.KOSNICA, V.KOSNICA i PETINA)                 |
| <b>A.2.2.</b> | Fekalna odvodnja naselja: Črnkovec, Lekneno i Trnje (FK NASELJA ČRNKOVEC - LEKNENO – TRNJE)                                                  |
| <b>A.2.3.</b> | Fekalna odvodnja naselja Kobilic (FK NASELJE KOBILIĆ)                                                                                        |
| <b>A.2.4.</b> | Fekalna odvodnja naselja: Ščitarjevo, Obrezina, Novaki ščitarjevski i Sasi (FK NASELJA ŠČITARJEVO, OBREZINA, NOVAKI i SASI)                  |
| <b>A.2.5.</b> | Fekalna odvodnja naselja: Drenje ščitarjevsko i dio Ščitarjeva (FK NASELJA DRENJE Š i ŠČITARJEVO)                                            |
| <b>A.2.6.</b> | Kolektor fekalne kanalizacije Kobilic – Rakarje – kolektor 1 i crpna stanica 7 – 2. faza (FK spojini KOBILIĆ - RAKARJE, kolektor K-1 sa PS7) |
| <b>A.2.7.</b> | Fekalna odvodnja naselja Bapča s kolektorom i crpne stanice Bapča i Črnkovec 2 (FK NASELJE BAPČA sa PS Bapča i Črnkovec2)                    |

**Ukupna izgrađenost po dionicama od 01.07.2020. do 31.07.2020. godine:**

- **A.2.3. FEKALNA ODVODNJA NASELJA KOBILIĆ**
  - Ukupno je izgrađeno 2.477,68 m
- **A.2.6. GRAVITACIJSKI KOLEKTORI: K-2 i K-2.1, tlačni cjevovod i crpna stanica Kobilić 2**
  - Ukupno je izgrađeno 1.860,68 m



*Ugradnja cijevi u naselju Kobilić*



*Gravitacijski kanal u naselju Kobilić*



*Tlačna proba cjeline A.2. u naselju Kobilić*




*Uvećani prikaz - tlačna proba cjeline A.2. u naselju Kobilic*

**U narednom periodu planiraju se radovi na dionicama:**

- **A.2.3. FEKALNA ODVODNJA NASELJA KOBILIĆ**
  - Na fekalnoj odvodnji naselja Kobilic završava se sa izvedbom kućnih priključaka
- **A.2.6. GRAVITACIJSKI KOLEKTORI: K-2 i K-2.1, TLAČNI CJEVOVOD I CRPNA STANICA KOBILIĆ 2**
  - Gravitacijski kolektori: K-2 i K-2.1, završiti će se gradnja crpne stanice Kobilic 2.

### A3. DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZA PODRUČJE DONJEG TUROPOLJA

#### Vizualni prikaz stanja radova na lotu A3

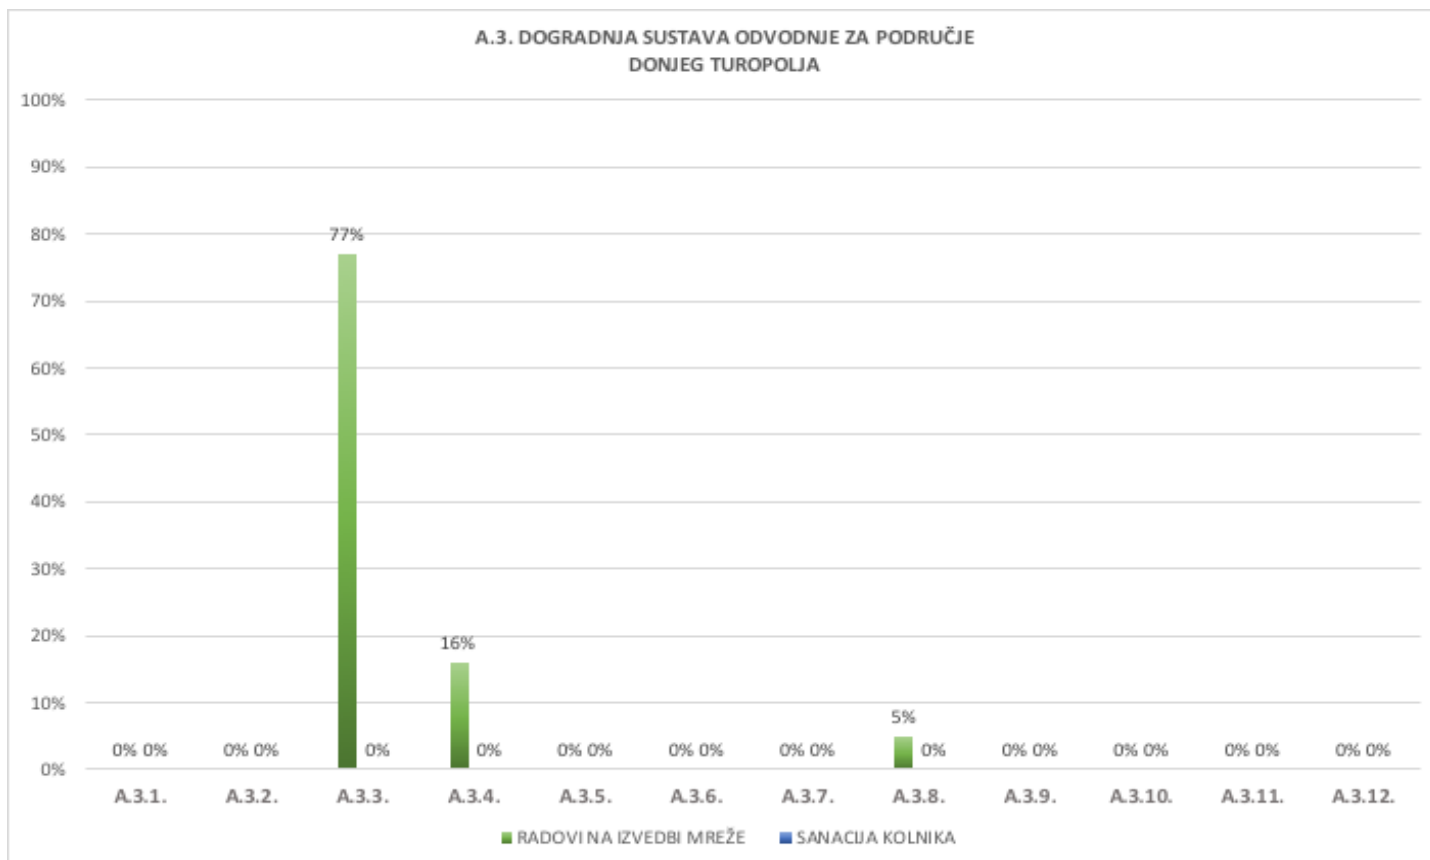

#### Legenda – popis dionica

|                |                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.3.1.</b>  | Sustav odvodnje Donjeg Turopolja, podsustav (tehnoekonomska cjelina) Buševac - Ogulinec - 1. faza gradnje (TEC BUŠEVEC-OGULINEC 1.FAZA)               |
| <b>A.3.2.</b>  | Sustav odvodnje Donjeg Turopolja, podsustav (tehnoekonomska cjelina) Buševac - Ogulinec - 2. faza gradnje (TEC BUŠEVEC-OGULINEC 2.FAZA)               |
| <b>A.3.3.</b>  | Sustav odvodnje Donjeg Turopolja, podsustav (tehnoekonomska cjelina) Mracilin - Okuje – 1. faza gradnje (TEC MRACLIN-OKUJE 1.FAZA)                    |
| <b>A.3.4.</b>  | Sustav odvodnje Donjeg Turopolja, podsustav (tehnoekonomska cjelina) Mracilin - Okuje – 2. faza gradnje (TEC MRACLIN-OKUJE 2.FAZA)                    |
| <b>A.3.5.</b>  | Sustav odvodnje Donjeg Turopolja, podsustava Gornje Podotočje – Kuće – 2.faza gradnje (TEC KUĆE-G.PODOTOČJE 2.FAZA)                                   |
| <b>A.3.6.</b>  | Sustav odvodnje Donjeg Turopolja, podsustav (tehnoekonomska cjelina) Turopolje – Rakitovec – 1. faza gradnje (TEC TUROPOLJE-RAKITOVEC 1.FAZA-spojini) |
| <b>A.3.7.</b>  | Sustav odvodnje Donjeg Turopolja, podsustav (tehnoekonomska cjelina) Turopolje - Rakitovec – 2. faza gradnje (TEC TUROPOLJE-RAKITOVEC 2.FAZA)         |
| <b>A.3.8.</b>  | Sustav odvodnje Donjeg Turopolja, podsustava Vukovina - Staro Čiče (TEC STARO ČIČE – VUKOVINA)                                                        |
| <b>A.3.9.</b>  | Sustav odvodnje Donjeg Turopolja, Spojni kanal CS Velika Kišovina - UPOV Velika Gorica (VELIKA KIŠOVINA- UPOV)                                        |
| <b>A.3.10.</b> | Sanacija Mracilin-Okuje                                                                                                                               |
| <b>A.3.11.</b> | Sanacija Busevec-Ogulinec                                                                                                                             |
| <b>A.3.12.</b> | Sanacija Kuće-G. Podotocje                                                                                                                            |

**Ukupna izgrađenost po dionicama od 01.07.2020. do 31.07.2020. godine:**

- **A.3.3. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 1. faza gradnje**
  - ukupno je izgrađeno 1.729,50 m
- **A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. faza gradnje**
  - ukupno je izgrađeno 1.234,72 m
- **A.3.8. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAVA (TEC) VUKOVINA – STARO ČIĆE**
  - ukupno je izgrađeno 658,11 m



*Zatrpavanje rova tucanikom*



*Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom*

**U narednom periodu planiraju se radovi na dionicama:**

- **A.3.3. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAV (TEC) MRACLIN-OKUJE, 1. FAZA GRADNJE**
  - Na sustavu odvodnje Donjeg Turopolja Podsustav (TEC) Mracilin-Okuje 1. faza gradnje nastavlja se s izvođenjem radova u naselju Mracilin u Ulici braće Radića.
- **A.3.4. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAV (TEC) MRACLIN-OKUJE, 2. FAZA GRADNJE**
  - Na sustavu odvodnje Donjeg Turopolja Podsustav (TEC) Mracilin-Okuje 2. faza gradnje nastavlja se sa izvođenjem radova u naselju Okuje u glavnoj ulici koja prolazi kroz naselje.
- **A.3.8. SUSTAV ODVODNJE DONJEG TUROPOLJA PODSUSTAV (TEC) VUKOVINA-STARO ČIČE**
  - Na sustavu odvodnje Donjeg Turopolja Podsustav (TEC) Vukovina- Staro Čiče nastavljaju se radovi u naselju Staro Čiče u Ulici Jurja Habelića.
